zoneng ENGENHARIA

NÓS CONSTRUÍMOS.

Planejamento de Atividades de Construção

Cronograma Replanejado

The Controller ENGENHARIA

Id	ATIVIDADE	INÍCIO	DURAÇÃO	TÉRMINO
1	**VARANDAS DO ROSAS**	**Seg 03/12/18**	**587 dias**	**Ter 02/03/21**
2	**CONSTRUÇÃO**	**Seg 03/12/18**	**542 dias**	**Ter 29/12/20**
3	**PRÉ OBRA**	**Seg 03/12/18**	**40 dias**	**Sex 25/01/19**
4	Canteiro de Obra	Seg 03/12/18	40 dias	Sex 25/01/19
5	Vistorias, Implantação e Mobilização	Seg 03/12/18	40 dias	Sex 25/01/19
6	**FACHADAS PRINCIPAIS**	**Qua 02/01/19**	**500 dias**	**Ter 01/12/20**
7	**FASE 1**	**Qua 02/01/19**	**293 dias**	**Sex 14/02/20**
8	**Serviços prévios**	**Qua 02/01/19**	**34 dias**	**Seg 18/02/19**
9	Montagem de fachadeiros e bandeja	Qua 02/01/19	10 dias	Ter 15/01/19
10	Montagem de andaimes suspensos	Qua 16/01/19	18 dias	Sex 08/02/19
11	Entelamento de fachada	Sex 01/02/19	12 dias	Seg 18/02/19
12	**Andaime 8 (Varanda e viga) - Coluna 06**	**Sex 01/02/19**	**217 dias**	**Seg 02/12/19**
13	Demolição de pastilhas, remoção de toldo, retirada de caixa	Sex 01/02/19	76 dias	Sex 17/05/19
14	Execução de regularização interna	Seg 20/05/19	15 dias	Sex 07/06/19
15	Colocação de tela, chapisco em vigas e pontos de vigas	Sex 21/06/19	20 dias	Qui 18/07/19
16	Tratamento de estrutura	Sex 12/07/19	5 dias	Qui 18/07/19
17	Execução de emboço em vigas	Sex 19/07/19	15 dias	Qui 08/08/19
18	Impermeabilização de Juntas	Sex 09/08/19	5 dias	Qui 15/08/19
19	Assentamento de Pastilhas e Peitoris	**Sex 26/07/19**	35 dias	Qui 12/09/19
20	Montagem de Esquadrias e Guarda Corpos	**Sex 13/09/19**	22 dias	Seg 14/10/19
21	Tratamento de Juntas	**Ter 15/10/19**	5 dias	Seg 21/10/19
22	Recomposição de forros e pisos	**Ter 22/10/19**	15 dias	Seg 11/11/19
23	Pintura e limpeza	**Ter 12/11/19**	15 dias	Seg 02/12/19
24	**Andaime 3 (Varanda e viga) - Coluna 02**	**Sex 01/02/19**	**203 dias**	**Ter 12/11/19**
25	Demolição de pastilhas, remoção de toldo, retirada de caixas de ar e proteções diversas	Sex 01/02/19	62 dias	Seg 29/04/19
26	Tratamento de estrutura	Qui 02/05/19	15 dias	Qua 22/05/19
27	Execução de regularização interna	Qui 23/05/19	16 dias	Qui 13/06/19
28	Colocação de tela, chapisco e pontos de vigas	Sex 14/06/19	11 dias	Sex 28/06/19
29	Execução de emboço em vigas	Seg 01/07/19	15 dias	Sex 19/07/19
30	Impermeabilização de Juntas	Seg 22/07/19	5 dias	Sex 26/07/19
31	Assentamento de Pastilhas e Peitoris	**Seg 08/07/19**	35 dias	Sex 23/08/19
32	Montagem de Esquadrias e Guarda Corpos	**Seg 26/08/19**	22 dias	Ter 24/09/19
33	Tratamento de Juntas	**Qua 25/09/19**	5 dias	Ter 01/10/19
34	Forro de Gesso	**Qua 02/10/19**	15 dias	Ter 22/10/19
35	Pintura e limpeza	**Qua 23/10/19**	15 dias	Ter 12/11/19
36	**Andaime 4 (Varanda e viga) - Coluna 01**	**Sex 01/02/19**	**202 dias**	**Seg 11/11/19**
37	Demolição de pastilhas, remoção de toldo, retirada de caixas de ar e proteções diversas	Sex 01/02/19	62 dias	Seg 29/04/19
38	Tratamento de estrutura	Qui 02/05/19	15 dias	Qua 22/05/19
39	Execução de regularização interna	Qui 23/05/19	16 dias	Qui 13/06/19
40	Colocação de tela, chapisco e pontos de vigas	Sex 14/06/19	10 dias	Qui 27/06/19
41	Execução de emboço em vigas	Sex 28/06/19	15 dias	Qui 18/07/19
42	Impermeabilização de Juntas	Sex 19/07/19	5 dias	Qui 25/07/19
43	Assentamento de Pastilhas e Peitoris	**Sex 05/07/19**	35 dias	Qui 22/08/19
44	Montagem de Esquadrias e Guarda Corpos	**Sex 23/08/19**	22 dias	Seg 23/09/19
45	Tratamento de Juntas	**Ter 24/09/19**	5 dias	Seg 30/09/19
46	Forro de Gesso	**Ter 01/10/19**	15 dias	Seg 21/10/19
47	Pintura e limpeza	**Ter 22/10/19**	15 dias	Seg 11/11/19
48	**Andaime 1 (Empena) - Coluna 02**	**Sex 01/02/19**	**156 dias**	**Sex 06/09/19**
49	Demolição de pastilhas, remoção de toldo, retirada de caixas de ar e proteções diversas	Sex 01/02/19	44 dias	Qua 03/04/19
50	Execução de dreno de ar condicionado	Seg 08/04/19	15 dias	Sex 26/04/19
51	Tratamento de estrutura	Seg 06/05/19	10 dias	Sex 17/05/19
52	Colocação de tela e chapisco	Seg 20/05/19	15 dias	Sex 07/06/19
53	Execução de emboço e juntas	Ter 11/06/19	26 dias	Ter 16/07/19
54	Impermeabilização de Juntas	Qua 17/07/19	5 dias	Ter 23/07/19
55	Assentamento de Pastilhas e Peitoris	**Qua 24/07/19**	25 dias	Ter 27/08/19
56	Tratamento de Juntas	**Qua 28/08/19**	5 dias	Ter 03/09/19
57	Forro de Gesso	**Qua 04/09/19**	1 dia	Qua 04/09/19
58	Pintura (último pavimento)	**Qui 05/09/19**	2 dias	Sex 06/09/19
59	**Andaime 2 (Recúo) - Coluna 02**	**Sex 01/02/19**	**236 dias**	**Seg 30/12/19**
60	Tarefa fantasma - uso exclusivo para movimento de carga	Sex 01/02/19	0 dias	Sex 01/02/19
61	Demolição de pastilhas, remoção de toldo, retirada de caixas de ar e proteções diversas	Sex 01/02/19	35 dias	Qui 21/03/19
62	Tratamento de estrutura	Sex 10/05/19	6 dias	Sex 17/05/19
63	Colocação de tela e chapisco	Seg 20/05/19	15 dias	Sex 07/06/19
64	Execução de emboço e juntas - pano	Seg 10/06/19	15 dias	Sex 28/06/19
65	Execução de emboço e juntas - lateral de viga varanda	Seg 01/07/19	7 dias	Ter 09/07/19
66	Impermeabilização de Juntas	Qua 10/07/19	3 dias	Sex 12/07/19
67	Assentamento de Pastilhas e Peitoris	**Seg 08/07/19**	15 dias	Sex 26/07/19
68	Tratamento de Juntas	**Seg 29/07/19**	3 dias	Qua 31/07/19
69	Forro de Gesso	**Qui 01/08/19**	1 dia	Qui 01/08/19
70	Pintura (último pavimento)	**Sex 02/08/19**	2 dias	Seg 05/08/19
71	Tarefa fantasma - uso exclusivo para movimento de carga	Seg 30/12/19	0 dias	Seg 30/12/19
72	**Andaime 5 (Recúo) - Coluna 01**	**Sex 01/02/19**	**236 dias**	**Seg 30/12/19**
73	Tarefa fantasma - uso exclusivo para movimento de carga	Sex 01/02/19	0 dias	Sex 01/02/19
74	Demolição de pastilhas, remoção de toldo, retirada de caixas de ar e proteções diversas	Seg 25/03/19	50 dias	Sex 31/05/19
75	Tratamento de estrutura	Seg 20/05/19	6 dias	Seg 27/05/19
76	Colocação de tela e chapisco	Ter 28/05/19	22 dias	Qua 26/06/19
77	Execução de emboço e juntas	Qua 10/07/19	15 dias	Ter 30/07/19
78	Impermeabilização de Juntas	Qua 31/07/19	3 dias	Sex 02/08/19
79	Assentamento de Pastilhas e Peitoris	**Qui 15/08/19**	20 dias	Qua 11/09/19
80	Tratamento de Juntas	**Qui 12/09/19**	3 dias	Seg 16/09/19
81	Forro de Gesso (ultimo pavimento)	**Ter 17/09/19**	1 dia	Ter 17/09/19
82	Pintura (último pavimento)	**Qua 18/09/19**	2 dias	Qui 19/09/19
83	Tarefa fantasma - uso exclusivo para movimento de carga	Seg 30/12/19	0 dias	Seg 30/12/19
84	**Andaime 6 (Empena) - Coluna 01**	**Seg 01/04/19**	**140 dias**	**Sex 11/10/19**
85	Demolição de pastilhas, remoção de toldo, retirada de caixa	Seg 01/04/19	39 dias	Qui 23/05/19
86	Execução de dreno de ar condicionado	Sex 24/05/19	10 dias	Qui 06/06/19
87	Colocação de tela e chapisco	Sex 14/06/19	22 dias	Seg 15/07/19
88	Tratamento de estrutura	Qua 10/07/19	4 dias	Seg 15/07/19
89	Execução de emboço e juntas	Qua 17/07/19	25 dias	Ter 20/08/19
90	Impermeabilização de Juntas	Qua 21/08/19	5 dias	Ter 27/08/19
91	Assentamento de Pastilhas e Peitoris	**Qua 28/08/19**	25 dias	Ter 01/10/19
92	Tratamento de Juntas	**Qua 02/10/19**	5 dias	Ter 08/10/19
93	Forro de Gesso (ultimo pavimento)	**Qua 09/10/19**	1 dia	Qua 09/10/19
94	Pintura (último pavimento)	**Qui 10/10/19**	2 dias	Sex 11/10/19
95	**Andaime 9 (Empena) - Coluna 06**	**Seg 08/04/19**	**172,6 dias**	**Qua 04/12/19**
96	Demolição de pastilhas e proteção esquadrias	Seg 08/04/19	31 dias	Sex 19/07/19
97	Tratamento de estrutura	Sex 19/07/19	10 dias	Sex 02/08/19
98	Colocação de tela e chapisco	Sex 02/08/19	25 dias	Sex 06/09/19
99	Execução de emboço e juntas	Sex 06/09/19	25 dias	Sex 11/10/19
100	Impermeabilização de Juntas	Sex 11/10/19	5 dias	Sex 18/10/19
101	Assentamento de Pastilhas e Peitoris	**Sex 18/10/19**	25 dias	Sex 22/11/19
102	Tratamento de Juntas	**Sex 22/11/19**	5 dias	Sex 29/11/19
103	Forro de Gesso	**Sex 29/11/19**	1 dia	Seg 02/12/19
104	Pintura (último pavimento)	**Seg 02/12/19**	2 dias	Qua 04/12/19
105	**Andaime 7 (Recúo) - Coluna 01 e 06**	**Sex 26/04/19**	**171,6 dias**	**Seg 23/12/19**
106	Demolição de pastilhas e proteção esquadrias	Sex 26/04/19	30 dias	Sex 07/06/19
107	Tratamento de estrutura	Sex 20/09/19	6 dias	Sex 27/09/19
108	Colocação de tela e chapisco	Seg 30/09/19	15 dias	Sex 18/10/19
109	Execução de emboço e juntas	Seg 21/10/19	15 dias	Sex 08/11/19
110	Impermeabilização de Juntas (Tinta Elastomérica)	Seg 11/11/19	3 dias	Qua 13/11/19
111	Assentamento de Pastilhas e Peitoris	**Sex 22/11/19**	15 dias	Sex 13/12/19
112	Tratamento de Juntas (Tarucel e Mastique)	**Sex 13/12/19**	3 dias	Qua 18/12/19
113	Forro de Gesso (ultimo pavimento)	**Qua 18/12/19**	1 dia	Qui 19/12/19
114	Pintura (último pavimento)	**Qui 19/12/19**	2 dias	Seg 23/12/19
115	**Andaime 10 (Recúo) - Coluna 5**	**Seg 01/07/19**	**130 dias**	**Sex 27/12/19**
116	Demolição de pastilhas, remoção de toldo, retirada de caixa	Seg 01/07/19	25 dias	Sex 02/08/19
117	Tratamento de estrutura	Seg 05/08/19	10 dias	Sex 16/08/19
118	Colocação de tela, chapisco em vigas e pontos	Seg 19/08/19	15 dias	Sex 06/09/19
119	Execução de emboço	Seg 09/09/19	30 dias	Sex 18/10/19
120	Impermeabilização de Juntas	Seg 21/10/19	5 dias	Sex 25/10/19
121	Assentamento de Pastilhas e Peitoris	**Seg 28/10/19**	35 dias	Sex 13/12/19
122	Tratamento de Juntas	**Seg 16/12/19**	10 dias	Sex 27/12/19
123	**Execução de mureta de periferia da cobertura**	**Seg 09/09/19**	**100 dias**	**Sex 24/01/20**
124	Andaime 1 (Empena) - Coluna 02	Seg 09/09/19	20 dias	Sex 04/10/19
125	Andaime 6 (Empena) - Coluna 01	Seg 14/10/19	20 dias	Sex 08/11/19
126	Andaime 9 (Empena) - Coluna 06	Seg 11/11/19	20 dias	Sex 06/12/19
127	Andaime 7 (Recúo) - Coluna 01 e 06	Seg 23/12/19	20 dias	Seg 20/01/20
128	Andaime 3 (Varanda e viga) - Coluna 02	Qua 13/11/19	20 dias	Ter 10/12/19
129	Andaime 4 (Varanda e viga) - Coluna 01	**Ter 12/11/19**	20 dias	Seg 09/12/19
130	Andaime 10 (Recúo) - Coluna 5	**Seg 30/12/19**	20 dias	Sex 24/01/20
131	Andaime 2 (Recúo) - Coluna 02	**Seg 30/12/19**	20 dias	Sex 24/01/20
132	Andaime 5 (Recúo) - Coluna 01	**Seg 30/12/19**	20 dias	Sex 24/01/20
133	Andaime 8 (Varanda e viga) - Coluna 06	**Ter 03/12/19**	20 dias	Seg 30/12/19
134	**Serviços finais**	**Ter 08/10/19**	**94 dias**	**Sex 14/02/20**
135	Desmontagem de andaimes suspensos	Ter 08/10/19	84 dias	Sex 31/01/20
136	Retirada de entelamento	Seg 27/01/20	10 dias	Sex 07/02/20
137	Desmontagem de bandeijão	Seg 03/02/20	10 dias	Sex 14/02/20
138	**FASE 2**	**Seg 13/05/19**	**306 dias**	**Seg 13/07/20**
139	**Serviços prévios**	**Seg 13/05/19**	**21 dias**	**Seg 10/06/19**
140	Montagem de fachadeiros e bandeja	Seg 13/05/19	8 dias	Qua 22/05/19
141	Montagem de andaimes suspensos	Qui 23/05/19	10 dias	Qua 05/06/19
142	Entelamento de fachada	Ter 04/06/19	5 dias	Seg 10/06/19
143	**Andaime 28 (Varanda e viga) - Coluna 3**	**Ter 11/06/19**	**204 dias**	**Sex 20/03/20**
144	Demolição de pastilhas, remoção de toldo, retirada de caixas de ar e proteções diversas	Ter 11/06/19	40 dias	Seg 05/08/19
145	Tratamento de estrutura	Ter 06/08/19	22 dias	Qua 04/09/19
146	Execução de regularização interna	Qui 05/09/19	22 dias	Sex 04/10/19
147	Colocação de tela, chapisco em vigas e pontos de vigas	Seg 07/10/19	10 dias	Sex 18/10/19
148	Execução de emboço em vigas	Seg 21/10/19	21 dias	Seg 18/11/19
149	Impermeabilização de Juntas	Ter 19/11/19	5 dias	Seg 25/11/19
150	Assentamento de Pastilhas e Peitoris	**Ter 05/11/19**	40 dias	Seg 30/12/19
151	Montagem de Esquadrias e Guarda Corpos	**Ter 31/12/19**	22 dias	Qua 29/01/20
152	Tratamento de Juntas	**Qui 30/01/20**	10 dias	Qua 12/02/20
153	Recomposição de forros e pisos	**Qui 13/02/20**	15 dias	Qua 04/03/20
154	Pintura e limpeza	**Qui 05/03/20**	12 dias	Sex 20/03/20
155	**Andaime 11 (Varanda e viga) - Coluna 5**	**Ter 11/06/19**	**220 dias**	**Seg 13/04/20**
156	Demolição de pastilhas, remoção de toldo, retirada de caixas de ar e proteções diversas	Ter 11/06/19	40 dias	Seg 05/08/19
157	Tratamento de estrutura	Ter 06/08/19	22 dias	Qua 04/09/19
158	Execução de regularização interna	Qui 05/09/19	22 dias	Sex 04/10/19
159	Colocação de tela, chapisco em vigas e pontos de vigas	Seg 07/10/19	10 dias	Sex 18/10/19
160	Execução de emboço em vigas	Seg 21/10/19	22 dias	Ter 19/11/19
161	Impermeabilização de Juntas	Qua 20/11/19	5 dias	Ter 26/11/19
162	Assentamento de Pastilhas e Peitoris	**Qua 06/11/19**	55 dias	Ter 21/01/20
163	Montagem de Esquadrias e Guarda Corpos	**Qua 22/01/20**	22 dias	Qui 20/02/20
164	Tratamento de Juntas	**Sex 21/02/20**	10 dias	Qui 05/03/20
165	Recomposição de forros e pisos	**Sex 06/03/20**	15 dias	Qui 26/03/20
166	Pintura e limpeza	**Sex 27/03/20**	12 dias	Seg 13/04/20
167	**Andaime 12 (Varanda e viga) - Coluna 12**	**Ter 11/06/19**	**220 dias**	**Seg 13/04/20**
168	Demolição de pastilhas, remoção de toldo, retirada de caixas de ar e proteções diversas	Ter 11/06/19	40 dias	Seg 05/08/19
169	Tratamento de estrutura	Ter 06/08/19	22 dias	Qua 04/09/19
170	Execução de regularização interna	Qui 05/09/19	22 dias	Sex 04/10/19
171	Colocação de tela, chapisco em vigas e pontos de vigas	Seg 07/10/19	10 dias	Sex 18/10/19
172	Execução de emboço em vigas	Seg 21/10/19	22 dias	Ter 19/11/19
173	Impermeabilização de Juntas	Qua 20/11/19	5 dias	Ter 26/11/19
174	Assentamento de Pastilhas e Peitoris	**Qua 06/11/19**	55 dias	Ter 21/01/20
175	Montagem de Esquadrias e Guarda Corpos	**Qua 22/01/20**	22 dias	Qui 20/02/20
176	Tratamento de Juntas	**Sex 21/02/20**	10 dias	Qui 05/03/20
177	Recomposição de forros e pisos	**Sex 06/03/20**	15 dias	Qui 26/03/20
178	Pintura e limpeza	**Sex 27/03/20**	12 dias	Seg 13/04/20
179	**Andaime 14 (Varanda e viga) - Coluna 11**	**Ter 11/06/19**	**220 dias**	**Seg 13/04/20**
180	Demolição de pastilhas, remoção de toldo, retirada de caixas de ar e proteções diversas	Ter 11/06/19	40 dias	Seg 05/08/19
181	Tratamento de estrutura	Ter 06/08/19	22 dias	Qua 04/09/19
182	Execução de regularização interna	Qui 05/09/19	22 dias	Sex 04/10/19
183	Colocação de tela, chapisco em vigas e pontos de vigas	Seg 07/10/19	10 dias	Sex 18/10/19
184	Execução de emboço em vigas	Seg 21/10/19	22 dias	Ter 19/11/19
185	Impermeabilização de Juntas	Qua 20/11/19	5 dias	Ter 26/11/19
186	Assentamento de Pastilhas e Peitoris	**Qua 06/11/19**	55 dias	Ter 21/01/20
187	Montagem de Esquadrias e Guarda Corpos	**Qua 22/01/20**	22 dias	Qui 20/02/20
188	Tratamento de Juntas	**Sex 21/02/20**	10 dias	Qui 05/03/20
189	Recomposição de forros e pisos	**Sex 06/03/20**	15 dias	Qui 26/03/20
190	Pintura e limpeza	**Sex 27/03/20**	12 dias	Seg 13/04/20
191	**Andaime 27 (Empena) - Coluna 04/05**	**Ter 11/06/19**	**178 dias**	**Qui 13/02/20**
192	Demolição de pastilhas, remoção de toldo, retirada de caixas de ar e proteções diversas	Ter 11/06/19	40 dias	Seg 05/08/19
193	Tratamento de estrutura	Ter 06/08/19	22 dias	Qua 04/09/19
194	Colocação de tela, chapisco em vigas e pontos	Qui 05/09/19	15 dias	Qua 25/09/19
195	Execução de emboço	Qui 26/09/19	35 dias	Qua 13/11/19
196	Impermeabilização de Juntas	Qui 14/11/19	5 dias	Qua 20/11/19
197	Assentamento de Pastilhas e Peitoris	**Qui 21/11/19**	45 dias	Qua 22/01/20
198	Tratamento de Juntas	**Qui 23/01/20**	10 dias	Qua 05/02/20
199	Recomposição de forros e pisos	**Qui 06/02/20**	3 dias	Seg 10/02/20
200	Pintura e limpeza	**Ter 11/02/20**	3 dias	Qui 13/02/20
201	**Andaime 13 (Empena) - Coluna 12/11**	**Qui 26/09/19**	**173 dias**	**Seg 25/05/20**
202	Demolição de pastilhas, remoção de toldo, retirada de caixas de ar e proteções diversas	Qui 26/09/19	30 dias	Qua 06/11/19
203	Tratamento de estrutura	Qui 07/11/19	22 dias	Sex 06/12/19
204	Colocação de tela, chapisco em vigas e pontos	Seg 09/12/19	15 dias	Sex 27/12/19
205	Execução de emboço	Seg 30/12/19	40 dias	Sex 21/02/20
206	Impermeabilização de Juntas	Seg 24/02/20	5 dias	Sex 28/02/20
207	Assentamento de Pastilhas e Peitoris	**Seg 02/03/20**	45 dias	Sex 01/05/20
208	Tratamento de Juntas	**Seg 04/05/20**	10 dias	Sex 15/05/20
209	Recomposição de forros e pisos	**Seg 18/05/20**	3 dias	Qua 20/05/20
210	Pintura e limpeza	**Qui 21/05/20**	3 dias	Seg 25/05/20
211	**Andaime 29 (Recúo) - Coluna 2**	**Seg 01/07/19**	**153 dias**	**Qua 29/01/20**
212	Demolição de pastilhas, remoção de toldo, retirada de caixas de ar e proteções diversas	Seg 01/07/19	35 dias	Sex 16/08/19
213	Tratamento de estrutura	Seg 19/08/19	22 dias	Ter 17/09/19
214	Colocação de tela, chapisco em vigas e pontos	Qua 18/09/19	15 dias	Ter 08/10/19
215	Execução de emboço	Qua 09/10/19	30 dias	Ter 19/11/19
216	Impermeabilização de Juntas	Qua 20/11/19	5 dias	Ter 26/11/19
217	Assentamento de Pastilhas e Peitoris	**Qua 27/11/19**	30 dias	Ter 07/01/20
218	Tratamento de Juntas	**Qua 08/01/20**	10 dias	Ter 21/01/20
219	Recomposição de forros e pisos	**Qua 22/01/20**	3 dias	Sex 24/01/20
220	Pintura e limpeza	**Seg 27/01/20**	3 dias	Qua 29/01/20
221	**Andaime 15 (Recúo) - Coluna 10/11**	**Seg 21/10/19**	**151 dias**	**Seg 18/05/20**
222	Demolição de pastilhas, remoção de toldo, retirada de caixas de ar e proteções diversas	Seg 21/10/19	30 dias	Sex 29/11/19
223	Tratamento de estrutura	Seg 02/12/19	15 dias	Sex 20/12/19
224	Colocação de tela, chapisco em vigas e pontos	Seg 23/12/19	15 dias	Sex 10/01/20
225	Execução de emboço	Seg 13/01/20	30 dias	Sex 21/02/20
226	Impermeabilização de Juntas	Seg 24/02/20	5 dias	Sex 28/02/20
227	Assentamento de Pastilhas e Peitoris	**Seg 02/03/20**	40 dias	Sex 24/04/20
228	Tratamento de Juntas	**Seg 27/04/20**	10 dias	Sex 08/05/20
229	Recomposição de forros e pisos	**Seg 11/05/20**	3 dias	Qua 13/05/20
230	Pintura e limpeza	**Qui 14/05/20**	3 dias	Seg 18/05/20
231	**Execução de mureta de periferia da cobertura**	**Qui 30/01/20**	**103 dias**	**Seg 22/06/20**
232	Andaime 27 (Empena) - Coluna 04/05	Sex 14/02/20	20 dias	Qui 12/03/20
233	Andaime 13 (Empena) - Coluna 12/11	Ter 26/05/20	20 dias	Seg 22/06/20
234	Andaime 28 (Varanda e viga) - Coluna 3	Seg 23/03/20	20 dias	Sex 17/04/20
235	Andaime 11 (Varanda e viga) - Coluna 5	Ter 14/04/20	20 dias	Seg 11/05/20
236	Andaime 12 (Varanda e viga) - Coluna 12	Ter 14/04/20	20 dias	Seg 11/05/20
237	Andaime 14 (Varanda e viga) - Coluna 11	**Ter 14/04/20**	20 dias	Seg 11/05/20
238	Andaime 29 (Recúo) - Coluna 2	**Qui 30/01/20**	20 dias	Qua 26/02/20
239	Andaime 15 (Recúo) - Coluna 10/11	**Ter 19/05/20**	20 dias	Seg 15/06/20
240	**Serviços finais**	**Seg 03/02/20**	**116 dias**	**Seg 13/07/20**
241	Desmontagem de andaimes suspensos	Seg 03/02/20	106 dias	Seg 29/06/20
242	Retirada de entelamento	Ter 23/06/20	10 dias	Seg 06/07/20
243	Desmontagem de bandeijão	Ter 30/06/20	10 dias	Seg 13/07/20
244	**FASE 3**	**Qua 20/11/19**	**270 dias**	**Ter 01/12/20**
246	**FACHADAS SECUNDÁRIAS**	**Qua 12/08/20**	**100 dias**	**Ter 29/12/20**
247	**TÉRREO (Recomposição de Pastilhas)**	**Qua 21/10/20**	**50 dias**	**Ter 29/12/20**
255	**TÉRREO (Execução de Granitos)**	**Qua 30/09/20**	**65 dias**	**Ter 29/12/20**
258	**PUC (Recomposição de Pastilhas)**	**Qua 21/10/20**	**50 dias**	**Ter 29/12/20**
267	**COBERTURAS E CASA DE MAQUINAS**	**Qua 12/08/20**	**100 dias**	**Ter 29/12/20**
276	**FINALIZAÇÕES**	**Qua 30/12/20**	**45 dias**	**Ter 02/03/21**
277	**FINALIZAÇÕES**	**Qua 30/12/20**	**45 dias**	**Ter 02/03/21**

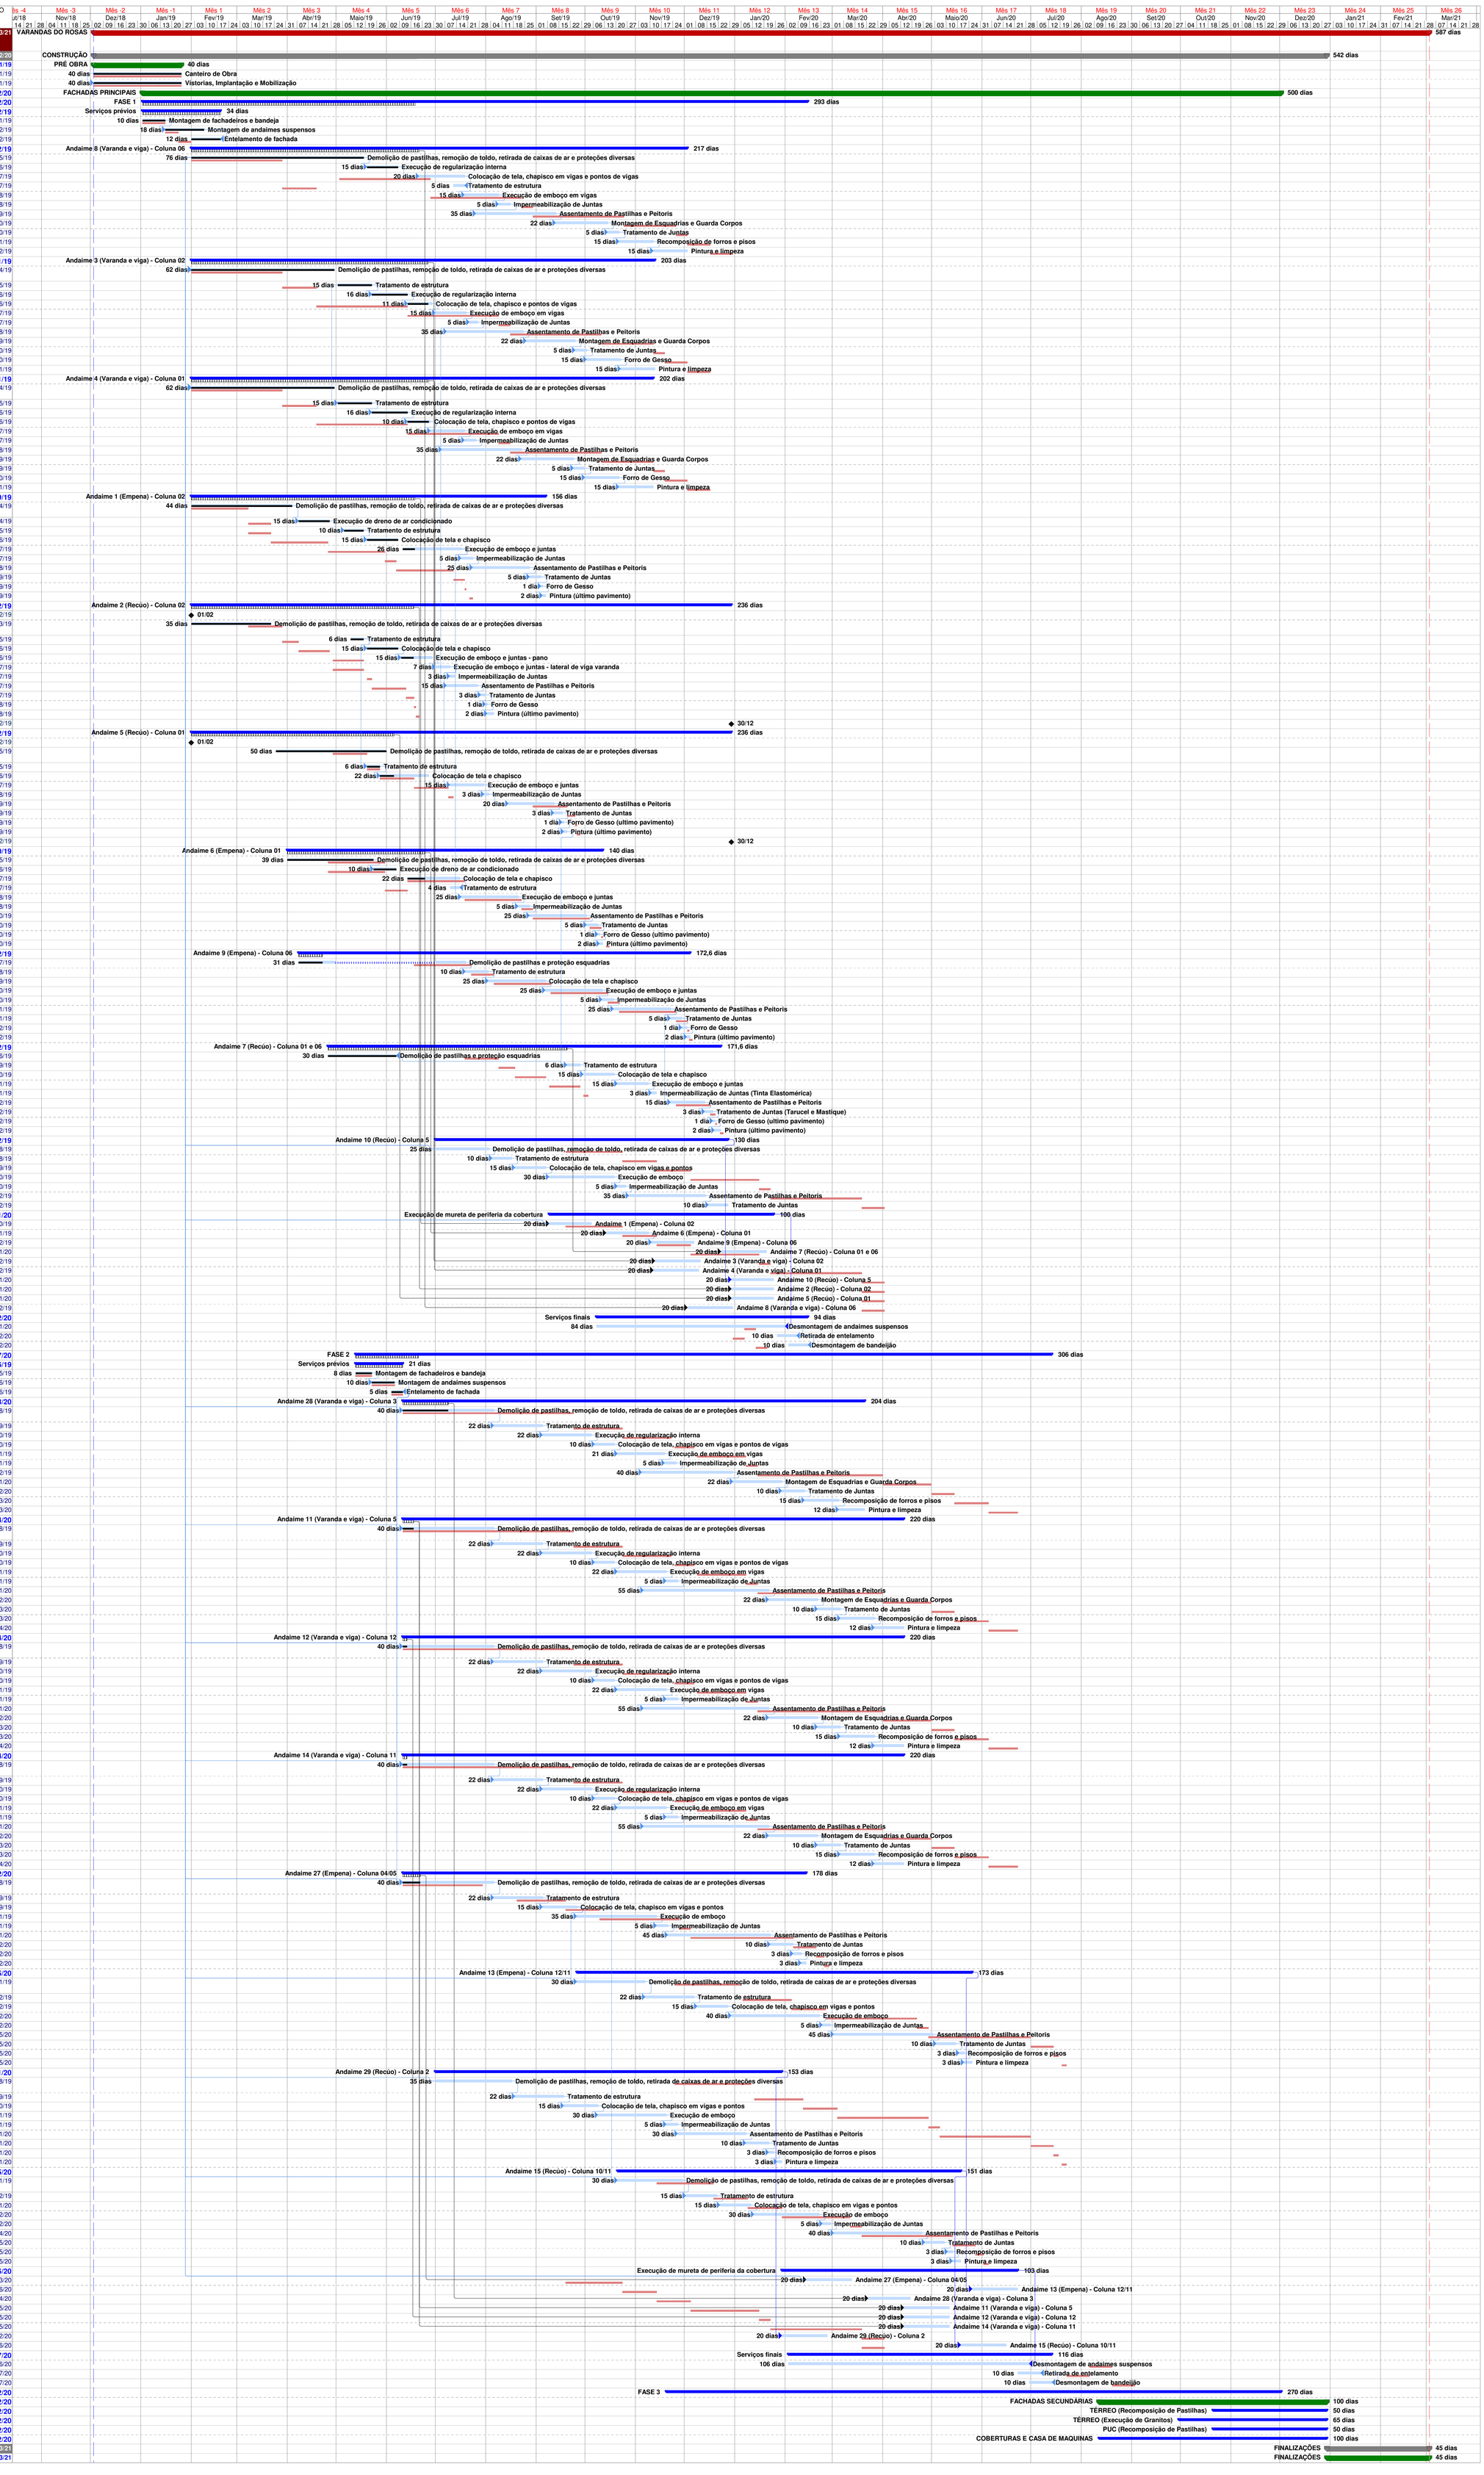

Início: Seg 03/12/18
Término Previsto: Ter 02/03/21

Crítica · Divisão crítica · Andamento crítico · Tarefa · Divisão · Andamento da tarefa crítica · Andamento da tarefa · Linha de base 1 · Linha de base · Divisão da linha de base · Etapa da linha de base · Etapa · Andamento do resumo · Resumo · Resumo do projeto · Tarefas externas · Etapa externa · Inactive Task · Inactive Milestone · Inactive Summary · Manual Task · Duration-only · Manual Summary Rollup · Manual Summary · Start-only · Finish-only · Data limite

The Controller Engenharia - Gestão Física
Cliente: Zoneng Engenharia
Replanejamento - Ter 18/06/19
